

Operations Playbook

Version: V1.0 · Stand: 07.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Worum geht es?	3
Verankerung im Unternehmen.....	3
Reflektion des Set of Choices im Playbook	3
Leitprinzipien des Playbooks	4
Geltungsbereich	4
Versionierung	4
Teil I – Das Projekt und seine Phasen	6
1 Was ist eine Veranstaltung?	6
2 Die acht Phasen einer Veranstaltung	9
3 Check-Points zwischen Phasen und Rollen.....	23
4 Unterschiede nach Veranstalter	24
5 Methodische Empfehlung zur Ausgestaltung	25
Teil II – Governance.....	26
6 Rollen und Lead Rollen	26
7 Gremien.....	28
8 Eskalationspfade.....	30
9 Entscheidungstypen	31
Teil III – Dienstleister	33
10 Dienstleister-Kategorien und Tiers.....	33
11 Abrechnungsmodelle	34
12 SLAs	36
Teil IV – Risiko und Krise	38
13 Risikomanagement.....	38
14 Krise und Triage	39
Teil V – Lernen und Verbessern	43
15 Die Konfiguration einer Veranstaltung.....	43
16 Retrospektiven	45

Anhang A – Sammelregister der offenen Punkte	47
[Offen – Allgemein] – 13 Punkte.....	47
[Offen – Dienstleister-Bezug] – 4 Punkte	47
[Offen – Governance-Bezug] – 5 Punkte	47
[Offen – KVP-Bezug] – 3 Punkte	48
[Offen – Entscheidung] – 2 Punkte	48
[Welle 2] – 3 Module (separates Dokument).....	48

Worum geht es?

Dieses Playbook ist der gemeinsame Spielplan, nach dem die operativen Teams in Customer & Expo Operations (CXO), Service Operations & Data (SOD) und die beteiligten Service Partner Veranstaltungen planen, durchführen und nachbereiten.

In jedem Kapitel folgt der Aufbau derselben Abfolge: **zuerst das Warum, dann das Was, dann das Wie**. Offene Punkte sind als solche markiert und am Ende des Playbooks in einem Sammelregister aufgeführt.

Verankerung im Unternehmen



Grafik 1. Verankerung des Playbooks in Unternehmenswerten und Set of Choices.

Das Playbook ist die konkrete Ausgestaltung der übergeordneten Leitlinien.

Reflektion des Set of Choices im Playbook

#	Choice	Im Playbook adressiert durch	Relevanz
1	Profitability over Growth Profitabilität vor Wachstum	Konfigurations-Review (Kapitel 14), Entscheidungstyp „kommerziell“ (Kapitel 8), KPI-Modul (Welle 2)	hoch
2	Customer Centricity over Internal Process Kundenzentrierung vor internem Prozess	Veranstaltungsleitung als „oberster Hut“, Drei-Hüte-Modell, Beschwerdepfad, SPOC-Frage	hoch
3	Following Fast over Pioneering Schnell folgen vor Pionierarbeit	Implizit: Konfiguration aus Vorveranstaltung ableiten (Kapitel 14), Prinzip „Standardisierung vor Ausnahme“	mittel
4	Group Synergies over Solo Actions Gruppensynergien vor Einzelaktionen	Wirkt auf Gruppenebene — nicht im Scope des operativen Playbooks der Messe.	gering
5	Sustainability over Convenience Nachhaltigkeit vor Bequemlichkeit	Risikokategorie ESG (Kapitel 12), ESG-SLA-Klauseln als Workshop-Thema (Kapitel 11)	gering
6	Modularity over Individuality Modularität vor Individualität	Ein Phasenmodell für alle (Kapitel 2), Veranstalter-Deltas (Kapitel 3), Konfigurations-Metapher (Kapitel 14)	hoch
7	Focus over Pleasing Everybody Fokus statt Gefälligkeit	Kunden-Eskalationsmanagement P4, Hard Cut vor P4, Grundsatz „niedrigste lösungsfähige Ebene“	hoch
8	Energy-efficient Venue over Additional Floor Space Energieeffizienz vor zusätzlicher Fläche	Indirekt über ESG-Risiken und Logistik-/Catering-SLA-Klauseln — primär Infrastruktur-Thema	gering

☒ hohe Playbook-Relevanz — schlägt direkt auf Regeln/Rollen durch ☐ mittel oder gering — implizit oder außerhalb des Playbook-Scopes

Grafik 2. Reflektion des Set of Choices im Playbook.

Leitprinzipien des Playbooks

Fünf Prinzipien tragen dieses Playbook. Sie sind die Grundlage für jede Entscheidung, jeden Standard und jedes Artefakt.

Strategische Einbettung. Operative Exzellenz ohne Strategie optimiert im falschen Koordinatensystem. Jede Regel in diesem Playbook muss mit den Unternehmens-Werten (People, Passion, Progress) und den strategischen Choices der Messe vereinbar sein. Konflikte eskalieren wir, statt sie stillschweigend zu umgehen.

Teamorientierung vor Bereichslogik. Veranstaltungen entstehen nicht in Silos. Die optimale Abwicklung in crossfunktionalen Teams hat Vorrang vor der Wahrung von Bereichshoheiten. Verantwortung folgt der Aufgabe, nicht der Organigrammlinie.

Wertkettenperspektive. Eine Maßnahme, die an einer Stelle optimiert, kann an anderer Stelle Reibung erzeugen. Wir prüfen jede Entscheidung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Trade-offs werden benannt, nicht versteckt.

Schnittstellenbewusstsein. Prozesse enden nicht an Abteilungs- oder Unternehmensgrenzen. Für jede relevante Schnittstelle definieren wir, was wohin fließt, wer was auslöst und wann ein bestehender Standard zu überprüfen ist.

Standardisierung vor Ausnahme. Standardisierung ist der Regelfall. Sonderlösungen sind begründungspflichtig und freigabepflichtig. Wer vom Standard abweicht, trägt die Beweislast.

Geltungsbereich

Das Playbook gilt für alle Veranstaltungen der Messe – unabhängig vom Veranstalter (Eigen-, Gast-, Partnerveranstaltung) und unabhängig von der Art (Kongress, Corporate Event, Messe B2B, Messe B2C).

Abgegrenzt sind:

- **Kaufmännische Kernprozesse** außerhalb der Veranstaltungsabwicklung. Sie liegen im Programm Sapphire.
- **Allgemeine Arbeitsplatzregeln** (Urlaub, Arbeitszeit, Kleiderordnung). Sie liegen im Mitarbeiterhandbuch.
- **Einzelne technische Standardaufgaben** (Code-Deployments, Server-Backups). Sie liegen in verknüpften Standard Operating Procedures (SOP).

Versionierung

Dies ist **Version 1.0**. In dieser Version ist die **Eigenveranstaltung** als Referenzrahmen angelegt. Details und andere Veranstaltungstypen (Partner, Gast, B2C) folgen in späteren Ausbaustufen. V0.4 arbeitete das fachliche Review der Messe ein (Schreibweisen und

Fakten, Abrechnungslogik in Kapitel 11, Gewerke-Einordnung Pflicht / Wahl-Pflicht / Wahl in Kapitel 10). V1.0 setzt die Entscheidungen des Validierungs-Workshops vom 02.07.2026 um: Zusammenlegung der früheren Phasen 2 und 3 zur gemeinsamen Phase P2 (Feinplanung) mit durchgehender Neu-Nummerierung P0 bis P6, beschlossene Gates für alle Phasenübergänge, formale Standabnahme vor Eröffnung sowie Lessons Learned als Abschluss des Veranstaltungszyklus.

Notiz: Der Validierungs-Workshop mit den Abteilungsleitungen hat am 02.07.2026 stattgefunden; die dort getroffenen Entscheidungen sind in dieser Version 1.0 eingearbeitet. Die Module Kommunikation & Kollaboration, KPI sowie Tailoring & Skalierung sind nicht Teil dieses Playbooks – sie werden in einem separaten Dokument ausgearbeitet (siehe Anhang A).

Teil I – Das Projekt und seine Phasen

1 Was ist eine Veranstaltung?

Auf einen Blick

Jede Veranstaltung bei der Messe wird als Projekt geführt. Drei Klassifikationen beschreiben eine Veranstaltung gemeinsam:

1. **Art** (was ist es inhaltlich?)
2. **Veranstalter** (wer veranstaltet?) und
3. **Größe** (wie groß?)

Eine konkrete Veranstaltung erhält aus jeder der drei Klassifikationen genau eine Zuordnung. Alle Arten und Veranstalter-Modelle durchlaufen dasselbe Phasenmodell – der Veranstalter verändert die Rollenbesetzung, nicht die Struktur.

Warum drei Klassifikationen?

Die drei Achsen – Art, Veranstalter, Größe – sind voneinander unabhängig. Eine Eigenveranstaltung kann groß oder klein sein. Eine Messe B2B kann Eigen, Partner oder Gast sein. Erst die Kombination beschreibt eine konkrete Veranstaltung präzise. Werden die Achsen vermischt, lassen sich Rollen, Verantwortungen und Abrechnungsmodelle nicht sauber zuordnen.

Die vier Veranstaltungsarten

Art	Charakter	Beispiele
Kongress (Konferenz)	Agendagetrieben, ein- bis zweitägig, begrenzte Teilnehmerzahl, Ticket 500–4.000 €, findet in Konferenzzentren statt. Lukrativ bei geringem operativem Aufwand.	Heat Pump Summit (Eigen)
Corporate Event	Galas, Parteitage, Jubiläen. Bestuhlung und Ausstattung, kein Standbau. Zu etwa 99 % im Veranstalter-Modell Gast.	CSU-Parteitag, Sternstunden-Gala, Sparkassen-Jubiläum
Messe B2B (Fachmesse)	Das klassische Messegeschäft. Fachkunden, Vertriebs- und Leadgenerierungs-Ziele. Umsatz-, anzahl- und belegungsstärkstes Segment.	FENSTERBAU FRONTALE, HOLZ-HANDWERK, embedded world, FACHPACK, Interzoo, Spielwarenmesse, Interlift, SPS
Messe B2C (Publikumsmesse)	Publikumsnah, Einzelbesucher. Günstigere Tickets (30–80 €). In der Praxis aktuell ausschließlich im Veranstalter-Modell Gast.	Freizeitmesse, Consumenta

“Kongress” und “Konferenz” sowie “B2C” und “Publikumsmesse” verwenden wir synonym. Den Begriff “Private Events” nutzen wir nicht – für Parteitage und vergleichbare Formate ist “Corporate Event” präziser.

Veranstalter und Betreiber

Innerhalb eines Veranstalter-Modells unterscheiden wir zwei Funktionsrollen:

Veranstalter trägt die inhaltliche Konzeption, Marke, das wirtschaftliche Risiko und stellt nach VStättV die Veranstaltungsleitung.

Betreiber verantwortet das Gelände: Halle und Infrastruktur, Pflicht-Gewerke (Elektro, Wasser, ITK, sicherheitsrelevante Leistungen), Geländesicherheit und Logistik im Gelände.

Bei **Eigenveranstaltungen** vereint die Messe beide Rollen. Bei **Gastveranstaltungen** liegt die Veranstalter-Rolle beim Gastveranstalter, die Messe ist nur Betreiber. Diese

Unterscheidung greift in Kapitel 4 (Unterschiede nach Trägerschaft) und Kapitel 5 (Rollen und Lead Rollen) durch.

Die drei Veranstalter-Modelle

Der Veranstalter beantwortet die Frage, wer das unternehmerische Risiko trägt und wer die Veranstaltung steuert.

Eigenveranstaltung. Die Messe ist zu 100 % Veranstalterin. Sie plant, vermarktet, verkauft und realisiert. Das volle unternehmerische Risiko liegt bei uns. Veranstaltungsleitung und TVK sind messeseitig besetzt.

Gastveranstaltung. Der Gastveranstalter ist zu 100 % Veranstalter. Er plant und vermarktet. Die Messe übernimmt die Betreiber-Rolle (Gelände, Pflicht-Gewerke), während die Veranstalter-Rolle beim Gastveranstalter liegt. Wahl-Gewerke können nach Beauftragung dazukommen.

Partnerveranstaltung. Ein seltener Sonderfall. Der Partner definiert Content und inhaltliche Ausrichtung. Die Messe hat die Durchführungshoheit und besitzt Anteile. „Fast wie eine Eigenveranstaltung, aber mit Partner.“ Beispiel: Interzoo in Partnerschaft mit dem WZF (Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer Fachbetriebe).



Grafik 3. Veranstalter-Modelle

Die drei Größenklassen

Wir klassifizieren nach Hallenfläche, Aussteller- und Besucherzahl. Hallenfläche folgt UFI-Standard und meint Brutto-Quadratmeter [Annahme – mit Messe zu bestätigen]; Aussteller- und Besucherwerte sind branchen-plausibel geschätzte Hypothesen – im Workshop anpassbar. Die drei Werte korrelieren typischerweise; eine Veranstaltung wird in eine Klasse einsortiert.

Klasse	> Aussteller	> Besucher	> Quadratmeter (brutto)
Klein	100	5.000	5.000
Mittel	300	15.000	20.000
Groß	1.500	50.000	100.000

Add-ons und Sonderfälle

Add-ons verändern das Aktivitätspaket in einzelnen Phasen, nicht die Phasenstruktur. Je nach Veranstaltung können weitere Module hinzukommen – diese sind in dieser Version noch nicht angelegt und folgen in späteren Phasen.

Beispiele:

- **Hybrid / Online-Anteil** – strategisch nicht mehr aktiv verfolgt. Ein bis zwei Veranstaltungen bilden Content online ab, behandelt als Sonderfall.
- **it-sa 365-Plattform** – ganzjährige Kundenplattform mit Webinaren parallel zur physischen it-sa. Historisch gewachsene Sonderlösung.
- **Kongress-Kombi** – Kongress und Messe parallel oder zeitversetzt zur selben Branche.
- **Sonderschau** – vom Veranstalter kuratierter Themenbereich innerhalb einer Messe.

Abgrenzung: Parallel laufende und sich überschneidende Veranstaltungen.

Eigenständige Veranstaltungen, die sich zeitlich überschneiden oder unmittelbar aufeinander folgen (z. B. Enforce Tac direkt vor bzw. parallel zur IWA), sind keine Add-ons: Sie durchlaufen jeweils ihr eigenes Phasenmodell mit eigenen Rollen. Aufgrund der hohen Umschlagshäufigkeit der Messe treten solche Überschneidungen regelmäßig auf. Sie verändern die Struktur des Playbooks nicht, erhöhen aber die Belastung in der Heißen Phase (P3) und der Aufbauphase (P4) erheblich und sind in der Kapazitätsplanung zu berücksichtigen.

	Kongress	Corporate Event	Messe B2B	Messe B2C
Eigen	Heat Pump Summit Eigenkongress, geringer Aufwand	kaum belegt	FENSTERBAU FRONTALE, HOLZ-HANDWERK dominantes Segment — „the world“	nicht belegt
Gast	je nach Saison vereinzelt	CSU-Parteitag, Sternstunden-Gala, Sparkassen-Jubiläum ~99 % der Corporate Events	IFH, Spielwarenmesse, Interlift 10–13 Gastmessen, wachsend	Freizeitmesse, Consumenta ausschließlich Gast
Partner	nicht belegt	nicht belegt	Interzoo (mit WZF) seltener Sonderfall	nicht belegt

☒ Dominante Kombination
 ☐ Belegt
 ☐ Nicht / kaum belegt

Grafik 4. Beispielhafte Einordnung des Veranstaltungsportfolios.

2 Die acht Phasen einer Veranstaltung

Auf einen Blick


Eine Veranstaltung durchläuft acht Phasen, benannt P0 bis P6. Die früheren Phasen 2 (Verkaufszeitraum Services) und 3 (Feinplanung) sind zur gemeinsamen Phase P2 (Feinplanung) zusammengelegt; die nachfolgenden Phasen rücken entsprechend auf. Die Zeitachse ist relativ zum ersten offiziellen Laufzeittag (T0). Grenzen sind weich – Aktivitäten

laufen parallel oder ziehen sich durch; an jedem Phasenübergang steht ein definiertes Gate (siehe Gate-Übersicht).

Warum acht Phasen

Zwei Phasen werden bewusst eigenständig geführt, die in vielen Frameworks implizit bleiben: **Sales und Marketing als P1** – das klassische Messegewerbe läuft kontinuierlich seit der Vorveranstaltung. Und **Nachbereitung als P7** – Rechnungsläufe und Claims dauern oft Wochen oder Monate. Beide verdienen eigene Aufmerksamkeit. Umgekehrt wurden die früheren Phasen 2 (Verkaufszeitraum Services) und 3 (Feinplanung) im Validierungs-Workshop (02.07.2026) zur gemeinsamen Phase P2 zusammengelegt: Sie laufen faktisch parallel und sind keine zeitliche Abfolge, sondern unterschiedliche Stränge derselben Phase – im Swimlane-Modell zwei besetzte Swimlanes in derselben Spalte.

Übersicht



Grafik 5. Veranstaltungsphasen.

Phase	Name	Zeitfenster	Primär-Träger
P0	Strategische Konzeption	T0 –12 bis –9 Monate	Brand & Marketing
P1	Sales + Marketing	T0 –9 bis –6 Monate	Sales + Brand & Marketing
P2	Feinplanung	T0 –6 bis –2 Monate	Customer Success + Operations Management + Expo Realisation + Logistics & Security
P3	Realisierung (Heiße Phase)	T0 –1 Monat bis –1 Tag	Operations Management
P4	Aufbauphase	T0 –3/4 Tage bis T0	Expo Realisation + ServicePartner
P5	Laufzeitphase	Eröffnung bis letzter Tag	Customer Success + Operations Management + Logistics & Security
P6	Abbauphase	T0 +1 bis +2 Tage	ServicePartner + Logistics & Security
P7	Nachbereitung	T0 +1 bis +4 Wochen	Operations

Phase	Name	Zeitfenster	Primär-Träger
			Management

Die Zeitfenster der Phasen können in der Realität überlappen. Zum Beispiel: P1 beginnt bereits während der Vorveranstaltung mit Rebooking. P0 der nächsten Veranstaltung startet häufig parallel zu P7 der aktuellen.

Die Trennung in diese Phasen ist konzeptionell, um Verantwortungen und Qualitätsstandards zuzuordnen.

Gates zwischen den Phasen

Im Validierungs-Workshop (02.07.2026) wurde für jeden Phasenübergang ein Gate beschlossen. Ein Gate definiert, was vorliegen muss, bevor die nächste Phase beginnt:

Übergang	Gate-Kriterien
P0 → P1	Security-/Logistik-Check; Checkliste; Briefing des Lead Committees; Ernennung des Lead Committees
P1 → P2	Informationen über die Sales-Kampagnen an die operativen Bereiche weitergeben
P2 → P3	Hallenplan im Tool OrgaNice erfasst; Cross-Check in OrgaNice durchgeführt
P3 → P4	Finale Hallenplanung liegt vor
P4 → P5	Standabnahme durch Veranstaltungstechniker; Feuerwehr-/Brandschutz-Check
P5 → P6	Abbaubesprechung
P6 → P7	Nur bei Gastveranstaltungen: Rückabnahme durch TVK
P7 → P0	Lessons Learned – schließt den Kreis zur nächsten Edition

Die operative Ausgestaltung je Gate – Checklisten-Inhalte, Verantwortliche, Dokumentationsort – wird im Rollout konkretisiert. Die Gates sind je Phasensektion in diesem Kapitel wiederholt.

P0 – Strategische Konzeption

Warum? Noch bevor jemand eine Halle bucht, legen Brand & Marketing die strategische Richtung fest: Was ist das Thema der nächsten Edition? Welche Zielgruppen holen wir wie an Bord? Ohne diese Phase fehlen der operativen Arbeit ab P2 die Leitplanken.

Was? Ergebnis sind Themenschwerpunkte, Marketingkonzept, Sales-Strategie (Pricing, Bundles), Ziel-KPIs (Besucher, Aussteller, Internationalität) und **Sicherheits-Grundkonzept** – Risiko-Profil und Setup-Annahmen für die Veranstaltung; Detailausarbeitung erfolgt in P2 durch Technical Lead (TVK). Zeitfenster 12 bis 9 Monate vor T0, oft aber als “Endloskreislauf” direkt nach der Vorveranstaltung beginnend.

Wer? Brand & Marketing führt. Sales unterstützt bei Pricing. Logistics & Security (SOD) liefert das Sicherheits-Grundkonzept zu. Customer & Expo Operations (CXO) ist in dieser Phase nicht beteiligt.

Wie? Der Übergang zu den operativen Bereichen (Check-Point CP-2a, Brand → Customer Success in P2) war bisher nicht formalisiert (Reibungspunkt SR-12); mit den Gates P0 → P1 und P1 → P2 ist er erstmals mit Kriterien hinterlegt.

Gate zu P1 (beschlossen). Security-/Logistik-Check; Checkliste; Briefing des Lead Committees; Ernennung des Lead Committees.

Offen:

- **[Offen] Weitere Bereiche in P0.** P0 ist weiter ausdefinierbar. Kandidaten für eine breitere Planungsrunde: Customer Success (frühe Key-Account-Planung), Expo Realisation (Hallen-/Flächenkonzept), Strategy & Portfolio (Portfolio-Fit). Welche Bereiche kommen über Brand & Marketing und Logistics & Security hinaus dazu?

P1 – Sales und Marketing

Warum? Das klassische Messegeschäft läuft als Dauerströmung. Rebooking beginnt bereits während der laufenden Veranstaltung, Scout-Trips und Kaltakquise ziehen sich durch das Jahr.

Was? Zeitfenster nominal 9 bis 6 Monate vor T0, faktisch kontinuierlich seit der Vorveranstaltung. Ziel: 30 bis 60 Prozent der Bestandsaussteller direkt zurückgewinnen, neue Aussteller qualifizieren, Marketing-Kampagnen planen und budgetieren.

Wer? Sales führt, Brand & Marketing arbeiten parallel. CXO ist selten direkt eingebunden – bei Großkunden (etwa eine komplette Halle für Siemens) läuft die Frühabstimmung über Sales und Customer Success.

Wie?

- Rebooking-Verträge bei laufender oder vorheriger Veranstaltung unterzeichnen lassen
- Scout-Trips zu ähnlichen Messen (Deutschland, Europa, USA, Brasilien) für Themenbeobachtung und Kundenwerbung - Kaltakquise intern oder über Callcenter-Dienstleister zur Lead-Vorqualifizierung
- Key-Account-Management für Großkunden
- Content- und Kampagnenplanung, Kanalauswahl (LinkedIn, Instagram, branchenspezifisch), Budgetplanung je Kampagne

Scharniermoment zu P2: “Kommst du wieder?” Die Ja-Entscheidung des Kunden ist der Übergang in die Feinplanung (P2).

Gate zu P2 (beschlossen). Informationen über die Sales-Kampagnen an die operativen Bereiche weitergeben.

Offen:

- **[IST-Befund] Blindspot bei Gastveranstaltungen (SR-11).** Bei Gastveranstaltungen sieht die Messe die vollständige Buchungslage des Gastveranstalters nicht. Rebooking-Transparenz fehlt.

P2 – Feinplanung

Warum? Der Kunde hat zugesagt. Jetzt konkretisiert sich die Veranstaltung: welche Fläche, welche Leistungen, welche Sonderwünsche. Parallel plant die Messe ihren Eigenbedarf (Foren, Lounges, Garderoben). Dies ist die umsatzrelevanteste Phase. Gleichzeitig geht der Aussteller mit den ServicePartnern ins Detail, und die Messe plant Sicherheit und Logistik für die Laufzeit. Beides läuft parallel – deshalb sind Verkauf und Detailplanung seit dem Validierungs-Workshop (02.07.2026) eine gemeinsame Phase mit zwei Strängen.

Was? Zeitfenster 6 bis 2 Monate vor T0. Der Shop geht etwa 6 Monate vor T0 live, die Hochzeit der Buchungen liegt 2 bis 3 Monate vor T0; parallel läuft die Detaillierungs- und Anfragephase mit den ServicePartnern.

Wer? Customer Success führt kundenseitig. Operations Management wickelt kaufmännisch ab und begleitet Buchungs-Detailfragen. Expo Realisation konzipiert den Eigenbedarf und führt die technische Detailplanung. Logistics & Security planen Sicherheit und Logistik für die Laufzeit.

Wie? Die Phase besteht aus zwei parallelen Strängen.

Strang A – Verkauf & Services. Zwei Hauptaufgaben:

Hauptaufgabe Kundenbedarf (Operations Management):

- Versand und Kundeninteraktion zu Buchungen (etwa Klärung der Hallenbelegung) - Kaufmännisches Einbuchen und Registrieren im ERP
- Buchung der Kundenbestellungen aus dem Shop, Validierung, Auftragsanlage
- Auslösen der Bestellungen bei ServicePartnern (Check-Point CP-2c)

Hauptaufgabe Eigenbedarf (Expo Realisation):

- Konzeption der Eigenbedarfs-Elemente (Foren, Couches, Garderoben, Lounges, Sonderbauten)
- Technische Umsetzungsplanung
- Validierung und Anlage der Leistungsverträge
- Bestellungen bei ServicePartnern für den Eigenbedarf

Scharniermoment innerhalb der Phase. Ende der Hauptbuchungen. Der Kunde wechselt ab jetzt häufig in die direkte Kommunikation mit den ServicePartnern (“Internalisierung” bei komplexen Gewerken). Der Schwerpunkt verlagert sich vom Verkaufs- in den Detailplanungs-Strang.

Strang B – Detailplanung. Der Aussteller geht mit den ServicePartnern ins Detail; die Messe plant parallel die Sicherheit und die Logistik für die Laufzeit.

- **Dreiergespräche** zwischen Aussteller, ServicePartner und (manchmal) Messe zur detaillierten Ausführungsplanung von Traglasten, Standbau, Sonderanforderungen. Die Messe ist bei komplexen Gewerken bei Beratung und Angebotserstellung meist nicht beteiligt.
- **ServicePartner** erstellen detaillierte Angebote an die Aussteller und prüfen Verfügbarkeiten eigenverantwortlich (aufgrund des nötigen Detailwissens unabdingbar und vertraglich festgelegt).
- **Customer Success** stimmt mit ServicePartnern spezifischen Eigenbedarf ab und handhabt die Security-Bestellung.
- **Logistics & Security** planen Logistik (Slot-Management für Ladehöfe, Anfahrt, Parkraum) und Security-Posten (Anzahl, Schichten, Kontrollumfang). Aus der strategischen Sicherheitskonzeption leiten sie einen Umsetzungsvorschlag ab und übergeben ihn an Expo Realisation (Check-Point CP-2d). Die eigentliche Bestellung löst Expo Realisation aus. Das Logistik-Handling bleibt durchgängig in SOD.

Bestellweg und Abrechnung. Der Bestellweg ist einheitlich: Alle Ausstellerprodukte werden über den Messe-Shop bestellt bzw. angefragt (auch z. B. Rigging). Der Bestellweg ist kein Abrechnungsmodell. Wie der Umsatz fließt, regeln drei Abrechnungsmodelle – welches greift, bestimmen Leistungsart, Vertragsgrundlage und rechtliche bzw. Haftungslage (Details in Kapitel 11):

- **Internalisierung** – prozentualer Umsatzanteil auf das direkt verhandelte Volumen. Typisch bei Speditionsleistungen/Logistik (Haftungsgründe), Standcatering und Individualleistungen im Standbau.
- **EK/VK-Prinzip** – Messe kauft ein und verkauft an den Aussteller/Messebauer weiter (typisch bei Elektro, Rigging, Wasser, Standreinigung, -bewachung)
- **Provision** – Messe erhält eine Vermittlungsprovision. Typisch bei Personalvermittlung (vermeidet den Dreiecksverleih); spielt vor allem bei Gastveranstaltungen eine Rolle.

Gate zu P3 (beschlossen). Hallenplan im Tool OrgaNice erfasst; Cross-Check in OrgaNice durchgeführt. Der Cross-Check beantwortet zugleich den bisher offenen Vollständigkeitscheck (SR-02).

Offen:

- **[IST-Befund] Zwei parallele Hauptaufgaben (Kunden- und Eigenbedarf) ohne systematische Kopplung (SR-13).** Operations Management und Expo Realisation bestellen teils bei denselben ServicePartnern, ohne koordinierte Sicht auf die Gesamtmenge.
- **[IST-Befund] Neue Sicherheitsbausteine ohne Pre-mortem (SR-06).** Beispiel Enforce Tac, Security-Check im “Flughafenmodus”: eingeführt ohne vorgeschaltete Risikoanalyse.

P3 – Realisierung (Heiße Phase)

Warum? Diese Phase ist der Verdichtungszeitraum, in dem sich fehlende Deadline-Disziplin rächt. Last-Minute-Änderungen/-Bestellungen, Ressourcenengpässe und spät auftretende Verzögerungen werden hier sichtbar.

Was? Zeitfenster 1 Monat bis 1 Tag vor T0. Intern "Heiße Phase" genannt – daher der Klammerzusatz im offiziellen Namen.

Wer? Operations Management trägt die Hauptlast. Customer Success kümmert sich um Last-Mile-Kundensupport (Visa, Einladungsschreiben, Key-Account-Abschluss).

Wie?

- **Kunde.** Erhält letzte Messeinfos (von CS), macht letzte Änderungen bzw. Last-Minute-Anpassungen/-Bestellungen für Messestand (Bsp. weitere Möbel, Nachbuchung Standreinigung)
- **Customer Success.** Letzte Detailplanung, Einhängung Sicherheit und Logistik, Kundenbetreuung.
- **Operations Management.** Changes und Stornos verarbeiten, neue Buchungen anlegen, Alternativvorschläge der ServicePartner koordinieren (Check-Point CP-3a: ServicePartner meldet Verfügbarkeit zurück und schlägt Alternativen vor – er kennt Portfolio und Lagerbestand am besten). Planung und Anmeldung der Service Buddies (Field Service). Anlage des Ticket-Systems für die Veranstaltung.
- **ServicePartner.** Eigenverantwortliche Verfügbarkeitsprüfungen. Frühzeitige Meldung an Operations Management, sobald einzelne Positionen (z. B. Mietstandtypen, Möbel) nicht mehr verfügbar sind; die ServicePartner beraten in dieser Phase selbst um und schlagen Alternativen vor.

Kunden-Eskalationsmanagement. Operations Management beschränkt den direkten Kundenkontakt auf ernsthafte Fälle. Bei Ressourcenengpässen (typisch: einzelne Möbel oder Mietstandtypen) erarbeitet der ServicePartner die Alternativen; das Team klärt sie mit ihm. Nur wenn unabwendbar, geht Operations Management mit dem Vorschlag zum Kunden (Check-Point CP-3b).

Gate zu P4 (beschlossen). Finale Hallenplanung liegt vor.

Offen:

- **[Beschlossen] Vollständigkeitscheck vor P3 (SR-02).** Kein harter Cut-off – sondern ein Vollständigkeitscheck: Was ist erledigt, was wandert offen in die Realisierungsphase mit? Im Validierungs-Workshop als Gate P2 → P3 beschlossen: Hallenplan und Cross-Check im Tool OrgaNice.

- **[IST-Befund] Kein Verzugsmonitoring auf Veranstaltungsebene (SR-09).** Verzögerungen im Order Management werden erst in dieser Phase sichtbar, wenn sich ServicePartner oder Kunden beschweren.

P4 – Aufbauphase

Warum? Die Ausstellerstände entstehen physisch. Gewerke greifen ineinander. Alles, was in den vorigen Phasen nicht geklärt wurde, wird hier zum Problem.

Was? Zeitfenster 3 bis 4 Tage vor T0 bis zum Eröffnungstag. Typischerweise am Wochenende und montags vor einem Dienstag-Eröffnungstag.

Wer? Expo Realisation und ServicePartner führen. Logistics & Security verantwortet den Ladehof.

Wie?

- **Customer Success und Expo Realisation.** Aufbau von Foren, Garderoben, Ruhezeiten, Food Areas, Cateringzonen. Troubleshooting mit SOD und ServicePartnern.
- **Logistics & Security.** Ladehof-Management (LKW-Koordination via Slot-Management). Security in der Aufbauphase präsent. Supervising des Ticket-Systems.
- **ServicePartner.** Standbau, Elektrik, Rigging, Wasser, ITK, Mietmöbel, Standreinigung. Koordination über die regelmäßige Gewerkekoordination und den Technischen Aufbau; die oft 20- bis 40-jährige Partnerschaft erleichtert die Abstimmung untereinander – ersetzt aber keine Planung.

Eine formale Abnahme vor der Eröffnung gab es bisher nicht – Customer Success prüfte informell auf der Fläche. Mit V1.0 ist die Abnahme als Gate beschlossen (siehe unten).

Risikoschwerpunkte.

- Müdigkeitsbedingte Fehler am Ende der Aufbauphase
- Müll oder unfertige Details, die morgens vor Öffnung entdeckt werden
- Diebstahl

Gate zu P5 (beschlossen). Standabnahme durch den Veranstaltungstechniker; Feuerwehr-/Brandschutz-Check.

P5 – Laufzeitphase

Warum? Die Veranstaltung findet statt. Im Idealfall läuft alles Vorbereitete wie geplant. In der Realität läuft Troubleshooting weiter, und unvorhergesehene Vorfälle erfordern rasche Entscheidungen.

Was? Zeitfenster von der Eröffnung bis zum letzten Laufzeittag. Typisch 2 bis 3 Tage, maximal 5.

Wer? Customer Success, Operations Management und Logistics & Security sind gleichzeitig präsent.

Wie?

- **Aussteller** kommen 1 bis 2 Stunden vor dem Besuchereinlass an. Ihren Stand kennen sie zu diesem Zeitpunkt in der Regel bereits: Individualstand-Kunden haben mit ihren Messebauern/Agenturen meist am letzten Aufbautag (ca. 13–14 Uhr) einen festen Übergabetermin oder begleiten den Aufbau stichprobenhaft; Mietstand-Kunden bestücken ihren Stand in der Regel am Nachmittag des letzten Aufbautags. Nur vereinzelt – etwa wetter- oder anreisebedingt – kommen Kunden erst kurz vor Messestart.
- **Customer Success und Expo Realisation** troubleshooten auf der Fläche. - **Operations Management** besetzt den **Service Point** als physischen Anlaufpunkt für Aussteller – Tickets anlegen, nachträglich verkaufen, weiterleiten.
- **ServicePartner-Center** (Offices der Tier-1-Partner in den Hallen) ermöglichen direkte Nachbestellungen (etwa zusätzlicher Stromanschluss).
- **Ticket-System** mit automatischem Routing nach Zuständigkeit und Halle. Supervising durch Operations Management, heute ohne formale SLAs.
- **Tägliches Sicherheitsmeeting** mit Polizei, Rotem Kreuz, Security-ServicePartner, Security-Team und TVK: was ist passiert, was steht heute an, welche besonderen Lagen.
- **ServicePartner** erbringen laufende Services: Standcatering, Reinigung, Entsorgung, Standbewachung, Incidentbehebung (z.B. Stromausfall am Stand).

Besucherstrom. Normaleinlass typisch 9 Uhr morgens (zum Messebeginn). Aussteller-Einlass 1 bis 2 Stunden früher.

Gate zu P6 (beschlossen). Abbaubesprechung.

Offen:

- **[IST-Befund] Keine formalen SLAs im Ticket-System (SR-10).** Routing ist automatisiert, Reaktionszeiten sind es nicht.

P6 – Abbauphase

Warum? Die Halle wird in kürzester Zeit komplett geleert. “Rückwärts abgespielte Aufbauphase.”

Was? Zeitfenster 1 bis 2 Tage nach Ende der Laufzeit. Clean Cut.

Wer? ServicePartner und Logistics & Security führen. Customer Success und Expo Realisation begleiten mit vermindertem Troubleshooting.

Wie?

- **ServicePartner** bauen ab, reinigen, entsorgen. Melden Verluste und Diebstähle.
- **Einige Stände** gehören den Kunden und werden für das nächste Jahr eingelagert. Unsere Tochter- bzw. Partner Holtmann und Wörnlein bieten Lagerflächen außerhalb Nürnbergs.
- **Logistics & Security** koordiniert den Clean-Cut – Ladehof-Management, Inventar-Übergabe, Security-Übergabe an die Hausverwaltung. Security operativ weniger aktiv, koordinativ aber Lead.

Risikoschwerpunkte.

- **[IST-Befund] Diebstahl von Exponaten.** Besonders wertvolle Stücke sind gefährdet. Heute existiert keine aktive Ausweis- oder Label-Kontrolle beim Abbau; jede Person könnte theoretisch Exponate abtransportieren. - Aussteller dürfen offiziell nicht vor einer definierten Uhrzeit auspacken, weil dies die Wertigkeit der Veranstaltung untergräbt.

Gate zu P7 (beschlossen). Bei Gastveranstaltungen: Rückabnahme durch den TVK. Bei Eigenveranstaltungen ist kein formales Gate erforderlich.

Offen.

- **[Offen] Hallen-Clean-Cut-Kriterium.** Welcher Zustand definiert “leer”? Wie lang darf der Prozess je Halle dauern?

P7 – Nachbereitung

Warum? Rechnungen laufen. Claims werden bearbeitet. Erkenntnisse sollten in die nächste Veranstaltung fließen – passiert heute aber nicht systematisch.

Was? Zeitfenster 1 bis 4 Wochen nach T0, bei größeren Veranstaltungen auch Monate.

Wer? Operations Management führt. Customer Success wird bei Key-Account-Claims eingebunden.

Wie?

- **Operations Management.** Rechnungsstellung an die Kunden. Weiterverrechnung der ServicePartner-Rechnungen (Prüfung, Durchleitung). Claim Management in beide Richtungen.
- **Spezielle Claim-Managerin** für stark eskalierende Fälle, teilweise in Abstimmung mit Invoiceteam, SP sowie CS & Brand.

Retrospektive.

- **[IST-Befund] Strukturierte Retrospektiven finden heute nicht systematisch statt (SR-08).** “Sollte passieren, sollte strukturiert sein, sollte moderiert stattfinden in der Breite. Wenn wir heute in den IST-Ablauf gehen: ist das nicht so.”
- **Portfolio-QBR** (Quarterly Business Review) ersetzt keine operative Retrospektive pro Veranstaltung.

Gate zu P0 (beschlossen). Lessons Learned – die Erkenntnisse fließen in die strategische Konzeption der nächsten Edition (Formate siehe Teil V).

Offen:

- **[Beschlossen] Abschluss der Nachbereitung.** Eine Veranstaltung ist formal abgeschlossen, wenn die Lessons Learned durchgeführt sind (Gate P7 → P0).
- **Retrospektive-Formate.** Die fünf Formate (Einzel-VA, Phasen-Retro, Portfolio, Post-mortem, Pre-mortem) sind in Teil V ausgearbeitet; die Lessons Learned aus Gate P7 → P0 laufen über die Einzel-VA-Retro.

3 Check-Points zwischen Phasen und Rollen

Auf einen Blick

Check-Points sind die Scharniere des Phasenmodells. An definierten Stellen wird ein Deliverable von einer Rolle oder Phase an eine andere weitergegeben. Acht Check-Points sind in dieser Version angelegt. Sie sind das Gerüst – Templates, Dokumentationsort und gegebenenfalls flankierende Meetings müssen pro Check-Point noch ausdefiniert werden.

Der wichtigste und bisher unschärfste Check-Point ist der Übergang von der strategischen Konzeption (Brand) in die Feinplanung (CXO). Mit den im Validierungs-Workshop beschlossenen Gates P0 → P1 und P1 → P2 ist dieser Übergang erstmals mit Kriterien hinterlegt.

Die acht Check-Points

#	Von → Zu	Phase	Deliverable
CP-2a	Brand & Marketing → Customer Lead	P0 → P2	Themenschwerpunkte, Marketingkonzept, Ziel-KPIs, Sales-Strategie
CP-2b	Customer Lead → Technical Lead	P2 innerhalb	Konzeptioneller Eigenbedarf (Foren, Lounges, Sonderbauten)
CP-2c	Operations Lead → Service Partner	P2 innerhalb	Bestellungen für Kundenbedarf (aus Shop-Buchungen)
CP-2d	Logistics & Security → Technical Lead	P2 innerhalb	Security-Umsetzungsvorschlag (Postenplan, Schichten)
CP-3a	Service Partner → Operations Lead	P3 innerhalb	Verfügbarkeitsmeldung und Alternativvorschlag (vom ServicePartner erarbeitet)
CP-3b	Operations Lead → Customer Lead + Kunde	P3 innerhalb	Eskalationsfall oder Alternativvorschlag (vom ServicePartner erarbeitet, von Operations Lead ausgespielt)
CP-5	Service Partner oder Service Point → Aussteller	P5 innerhalb	Nachbestellte Leistung oder Sofortkauf
CP-X	Lead Committee → AL-Ebene	beliebig	Nicht-lösbares operatives Thema zur Eskalation

Bekannte Schwachstellen

- **CP-2a (SR-12) Unscharfer Übergang Brand → CXO.** Der Übergabepunkt war formal nicht festgelegt; die Beteiligten regelten ihn situativ. Mit den Gates P0 → P1 und P1 → P2 erstmals mit Kriterien hinterlegt.

- **CP-3a (SR-09, SR-10) Verfügbarkeitsmeldungen ohne SLA.** Kein Frühwarnsystem, keine formalen Reaktionszeiten im Ticket-System.
- **CP-X (SR-03) Eskalation wird häufig übersprungen.** Themen landen direkt auf BL-Ebene, weil Rollen und Eskalationsregeln unscharf sind.

4 Unterschiede nach Veranstalter

Auf einen Blick

Die Phasenstruktur P0 bis P7 gilt für alle Veranstalter-Modelle. Was sich unterscheidet, ist die Verteilung zwischen Veranstalter- und Betreiber-Rolle: bei Eigenveranstaltungen trägt die Messe beide, bei Gast nur die Betreiber-Rolle. Verändert wird damit die Rollenbesetzung, die Autorität bestimmter Rollen und der Umfang ausgewählter Leistungen.

Vier Regeln

Veranstalter-Rolle bei Gast außerhalb der Messe. Der Gastveranstalter trägt die Veranstalter-Rolle: er stellt die inhaltliche Veranstaltungsleitung, die VStättV-Pflicht und ggf. eigene ServicePartner. Die Messe übernimmt die Betreiber-Rolle (Gelände, Pflicht-Gewerke). Wo Messe-Rollen die Gastrollen spiegeln – etwa ein messe-seitiges Account-Management gegenüber dem Gastveranstalter – haben sie eine andere Funktion und geringere Entscheidungsautorität als bei Eigen.

Gewerke-Einordnung: Pflicht, Wahl-Pflicht, Wahl. Pflicht-Gewerke (Elektro, Wasser, ITK, sicherheitsrelevante Leistungen) laufen auch bei Gast zwingend über die Messe. Wahl-Pflicht-Gewerke (z. B. Standreinigung) müssen erbracht werden – der Anbieter ist innerhalb der zugelassenen Optionen wählbar. Wahl-Gewerke (Standbau, Mietmöbel) kann der Gast eigenständig vergeben. Die Einordnung je Gewerk regelt Kapitel 10.

Ticket-System-Isolation bei Gast. Das Ticket-System des Gastveranstalters wird nicht an die Messe angebunden. Parallele Shops können entstehen. Blindspot im Rebooking (SR-11). Für Serviceprodukte sind Gastveranstalter an das Gast-OSC angebunden oder nutzen es direkt. [Offen] Begriffliche Abgrenzung Ticket-System vs. Gast-Shop (Gast-OSC) ist zu klären.

Partner-Hoheit. Der Partner definiert Content und inhaltliche Ausrichtung. Die Messe hat die Durchführungshoheit und besitzt Anteile. “Fast wie Eigen, aber mit Partner.”

Offen

- **[Offen] Ein konkretes RACI-Delta je Phase.** Wie genau unterscheidet sich die Besetzung? Aktuell nur als Grundsatz formuliert.
- **[Offen] Claim-Komplexität bei Gast.** Wer hat bestellt, wer hat geliefert, wem wird in Rechnung gestellt? “Ein paar Dimensionen mehr.”

5 Methodische Empfehlung zur Ausgestaltung

Ein Service Blueprint bietet sich als methodisches Rückgrat an. Die acht Phasen werden zu Spalten, die beteiligten Einheiten (Swimlanes, ab V0.2 nach den vier Kern-Abteilungen aufgedgliedert) zu Zeilen. In jeder Zelle lassen sich Kunden-Interaktionen, interne Aktivitäten, Systeme und Qualitätsstandards sauber abtragen. Wir füllen das heute nicht — aber das Template steht, wann immer wir pro Phase in die Tiefe gehen wollen.

EINHEIT / PHASE	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Kunde	—	—	—	—	—	—	—	—
Customer Success(CXO)	—	—	—	—	—	—	—	—
Expo Realisation(CXO)	—	—	—	—	—	—	—	—
Operations Management (SOD)	—	—	—	—	—	—	—	—
Logistics & Security(SOD)	—	—	—	—	—	—	—	—
ServicePartner	—	—	—	—	—	—	—	—
Andere(Brand, Sales, UK)	—	—	—	—	—	—	—	—
Systeme(Shop, Ticket, SCU)	—	—	—	—	—	—	—	—

Grafik 6. Template zur Ausgestaltung der Phasen.

Teil II – Governance

6 Rollen und Lead Rollen

Auf einen Blick


Drei Lead Rollen tragen die operative Gesamtverantwortung für eine Veranstaltung – als drei Verantwortungs-Dimensionen, nicht als drei Personen. Sie stimmen sich phasenabhängig ab und werden ergänzt durch weitere operative Rollen sowie eine klare Reporting-Linie ins Unternehmen.

Rollen versus Personen – Grundsatz

Rollen sind strukturell, Personen situativ. Eine Rolle kann rotieren oder auf mehrere Personen verteilt sein. Im Playbook sprechen wir ausschließlich über Rollen. Namen tauchen nur als Information auf, nicht als strukturbildendes Element.

Die Lead Committee-Logik

Die drei Lead Rollen sind drei Verantwortungs-Dimensionen, die zusammen die operative Gesamtverantwortung für eine Veranstaltung tragen. Eine Person kann mehrere Lead Rollen tragen; Lead Rollen können sich aufteilen oder zusammenfallen, ohne die Logik des Modells zu verändern. Die unten genannten Namen sind Platzhalter – die endgültigen Bezeichnungen werden im Workshop festgelegt.

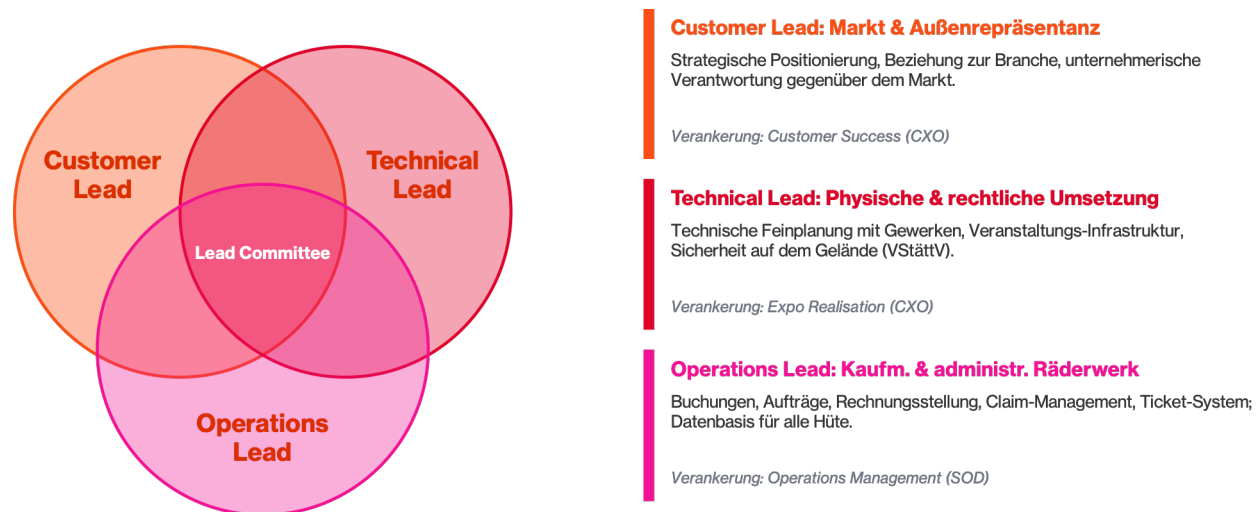

Grafik 7. Lead Rollen je Veranstaltung.

Customer Lead: Markt und Außenrepräsentation. Strategische Positionierung des Formats, Beziehung zu Branche und Großausstellern auf Augenhöhe, unternehmerische Verantwortung gegenüber dem Markt. Logik: strategisch, langfristig, beziehungsgetrieben.

Technical Lead: Physische und rechtliche Umsetzung. Technische Feinplanung mit Gewerken und Service Partnern, Koordination der Veranstaltungs-Infrastruktur, Verantwortung für Sicherheit auf dem Gelände. Lead in P2 (Detailplanungs-Strang) und P4.

Logik: operativ-technisch, compliance-getrieben. Trägt typischerweise die VStättV-Veranstaltungsleitung mit.

Operations Lead: Kaufmännisches und administratives Räderwerk.

Auftragsverarbeitung, Rechnungsstellung, Claim Management, Ticket-System-Supervising.
Logik: transaktional, prozessgetrieben, kontinuierlich.

Lead Rollen sind je Veranstaltung. Der Träger einer Technical Leadleibt über die gesamte Veranstaltung konstant (Vertretung im Einzelfall möglich, das Konstrukt selbst aber veranstaltungs-konstant). Das vereinfacht Kontinuität, Übergaben und Eskalations-Wege.

VStättV an Technical Lead Rolle geknüpft. Die Veranstaltungsleiter-Funktion gemäß § 38 VStättV (Brandschutz, Personenstrom, Räumung) verankert sich i.d.R. an Technical Lead – Expo Realisation übernimmt diese rechtliche Verantwortung bei Eigenveranstaltungen. Bei Gastveranstaltungen liegt die VStättV-Pflicht beim Gastveranstalter; die Schleife verschwindet messeseitig, Technical Lead bleibt aber bestehen.

Stand heute. Nur zwei Lead Rollen (A und B) tragen die operative Verantwortung gleichberechtigt. Operations Lead arbeitet, aber noch nicht als gleichberechtigte Lead Rolle.

Lead-Rollen-Doppelung bei Gastveranstaltungen

Bei Eigenveranstaltungen tragen die drei Lead Rollen sowohl die Veranstalter- als auch die Betreiber-Funktion. Bei Gastveranstaltungen entstehen zwei Sätze von Lead Rollen:

- **Veranstalter-Seite** beim Gastveranstalter – A/B/C dort angesiedelt.
- **Betreiber-Seite** bei der Messe – vor allem Technical Lead (Gelände, Sicherheit, Logistik) und Operations Lead (kaufmännisches Räderwerk). Customer Lead spiegelt sich messe-seitig als Account-Management-Funktion.

Die VStättV-Pflicht liegt bei Eigen an Technical Lead der Messe; bei Gast beim Gastveranstalter. Konsequenzen für Eskalations- und Kommunikationspfade sind Workshop-Thema.

Weitere operative Rollen

Detailrollen ordnen sich den Lead Rollen zu:

- **Unter Customer Lead:** keine eigenen Detailrollen – Customer Lead wird typischerweise von einer Schlüsselperson direkt getragen.
- **Unter Technical Lead:** Logistiker, Notfall- und Krisenmanager, Sicherheitsberater.
 - *Reporting:* AL Logistik + Security + Krisenmanagement.
- **Unter Operations Lead:** Invoice Manager, Order Manager, Service Buddy Manager, Service Manager, Service Point Manager.
 - *Reporting:* AL Operations Management.

Zusätzlich:

- **Service Buddy (Field Service)** – Freiwillige, app-geführte Ticketbearbeitung während der Laufzeit. Übergreifend, keine Lead Rolle.
- **Security Control Unit (SCU)** – 24/7-Dienstleister, extern gestellt.
- **Service Partner** als Gesamtgruppe: siehe Teil III (Dienstleister).

Reporting-Linien der Lead Rollen

- **Customer Lead** → AL Customer Success → BL Customer & Expo Operations (CXO) → Senior Bereichsleitung → CEO
- **Technical Lead** → AL Expo Realisation → BL Customer & Expo Operations (CXO) → Senior Bereichsleitung → CEO
- **Operations Lead** → AL Operations Management → BL Service Operations & Data (SOD) → Senior Bereichsleitung → CEO

Offen

- **[Offen] RACI-Unterschiede bei Gast versus Partner.** Wie verändert sich die Rollenbesetzung konkret?

7 Gremien

Auf einen Blick

Drei Gremien strukturieren die Entscheidungsfindung: der Lead Committee auf operativer Ebene (SOLL), das tägliche Sicherheitsmeeting während der Laufzeit (etabliert) und der Portfolio-QBR auf Management-Ebene (etabliert).

Lead Committee

Zweck. Gemeinsame operative Entscheidungsfindung der drei Lead Rollen (A, B, C) einer Veranstaltung. Tragen die operative Gesamtverantwortung in definiertem Rahmen.

Mitglieder. Customer Lead, Technical Lead und Operations Lead.

Ernennung. Die Ernennung und das Briefing des Lead Committees sind Bestandteil des Gates P0 → P1 (siehe Kapitel 2).

Rhythmus – phasenabhängig:

- P0–P1: selten, ad-hoc bei Bedarf
- P2 (Feinplanung): regelmäßig, ca. 14-tägig
- P3 (Realisierung): Dailies
- P4/P5 (Aufbau, Laufzeit): Dailies, bei Bedarf Hourlies
- P6/P7: Closing-Meetings, wöchentlich abklingend

Mandat. Operative Entscheidungen im Rahmen der Veranstaltungs-Konfiguration (siehe Teil V). Nicht-lösbare Themen eskalieren gemeinsam an die Abteilungsleitungs-Ebene. Plus Pflicht-Teilnahme beim Pre-mortem vor Aktivierung einer Konfiguration.

Stand. Heute nicht etabliert, weil die dritte Lead Rolle fehlt.

Tägliches Sicherheitsmeeting

Zweck. Tägliche Lagebesprechung in der Laufzeitphase: was ist passiert, was steht heute an, welche besonderen Lagen (Brandschutzübungen, Demonstrationen, Waffenvorfürungen bei Enforce Tac).

Lead. TVK – moderiert das Meeting und klärt Entscheidungs- und Eskalationsbedarf.

Mitglieder. TVK (Lead), Notfall- und Krisenmanager, SCU, Polizei, Rotes Kreuz, Security-ServicePartner.

Rhythmus. Jeden Laufzeittag während P5.

Mandat. Operative Sicherheitsentscheidungen für den aktuellen Laufzeittag. Keine strategischen Entscheidungen.

Stand. Etabliert.

Portfolio-QBR (Quarterly Business Review)

Zweck. Portfoliobetrachtung auf BL-Ebene. Jeder BL bringt die aggregierten Retro-Ergebnisse seines Bereichs mit – der QBR ist damit der Andockpunkt der operativen Retrospektiven in die Management-Ebene.

Mitglieder. Senior Bereichsleitung, CXO BL, BL SOD, weitere Bereichsleitungen.

Pflicht-Input pro BL. Aggregierte Retro-Ergebnisse pro Bereich (siehe Retrospektive-Formate).

Rhythmus. Quartalsweise.

Mandat. Portfolio-Strategie, Investitionsentscheidungen, Priorisierung des Portfolios – auf Basis der bereichsweise aggregierten Retros.

Stand. Etabliert. Ersetzt aber keine operative Retrospektive pro Veranstaltung (SR-08).

Meeting-Rhythmus

Der Rhythmus unterscheidet sich stark zwischen den Gremien. Er ist entweder an die Veranstaltung oder an einen Jahresrhythmus gebunden.

	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Lead Committee	○	○	●	●●●	●●●●	●●●●	●●	●
Tägl. Sicherheitsmeeting	-	-	-	-	○	●●●	○	-
Portfolio-QBR	quartalsweise — phasenunabhängig							

○ ad-hoc / bei Bedarf

● ca. 14-tägig

●● wöchentlich

●●● täglich

●●● bis zu mehrmals täglich

Grafik 8. Schematische Darstellung von Meeting-Häufigkeit der verschiedenen Gremien.

8 Eskalationspfade

Auf einen Blick

Zwei Eskalationspfade strukturieren den Umgang mit Themen, die nicht auf der operativen Ebene gelöst werden können: der **Standardpfad** für operative Themen und der **Beschwerdepfad** für Aussteller. Die Eskalation bei Krisen ist davon getrennt und liegt im Krisenmanagement (Kapitel 13).

Zeitschwellen und Wege sind Vorschläge – die Operationalisierung (verbindliche Reaktionszeiten, Tools, Pflicht-Eskalationsrollen) ist Workshop-Frage.

EP-01 – Standard-Eskalationspfad (operativ)

Auslöser. Nichtlösbarkeit auf der operativen Ebene, Zeitüberschreitung.

Stufe	Eskalationsrolle	Reaktionszeit	Weg (Vorschlag)
1	Lead Committee	tbd	Gespräch / Jour Fixe
2	AL-Runde (AL Customer Success + AL Expo Realisation + AL Operations Management)	tbd	E-Mail + Termin
3	BL Customer & Expo Operations + BL Service Operations & Data	tbd	Eskalationsmail + Termin
Ende	Senior Bereichsleitung	tbd	–

Grundsatz. Themen werden auf der niedrigsten lösungsfähigen Ebene gelöst. Stufe 1 (Lead Committee) ist die Ziel-Ebene – heute landen viele Themen direkt auf Stufe 2 oder 3 (SR-03).

EP-02 – Beschwerdepfad (Aussteller)

Auslöser. Kunde meldet ein Problem, das nicht am Service Point gelöst werden kann.

Stufe	Eskalationsrolle	Reaktionszeit	Weg (Vorschlag)
1	Operations Lead /	tbd	Ticket, Service Point,

Stufe	Eskalationsrolle	Reaktionszeit	Weg (Vorschlag)
2	Service Point	tbd	Telefon, E-Mail
	AL Operations Management		E-Mail + Gespräch
3	[Offen]	tbd	[Offen]

Offen.

- **[Offen] Stufe 3 des Beschwerdepfads (SR-07).** Bei Key-Accounts existieren informelle SPOCs, strukturell fehlt ein einheitlicher Weg. Faktisch melden sich Aussteller heute über viele Kanäle: bei Sales bzw. am Rebooking-Stand (weil sie dort ohnehin neu buchen) oder bei Customer Success (weil sie die Ansprechpartner aus der Messevorbereitung kennen). Perspektivisch braucht es einen definierten Meldeweg – Lösungskandidat: QR-Code am Stand für Beschwerden und Bedarfe aller Art.
- **[Offen] Reaktionszeiten je Stufe.** Pro Pfad und Stufe verbindlich festlegen.

Gast- und Partnerveranstaltungen

EP-01 spiegelt sich teilweise (Gast-Veranstaltungsleitung eskaliert intern beim Gast). EP-02 greift unverändert auf der Messe-Seite.

9 Entscheidungstypen

Auf einen Blick

Vier Entscheidungstypen strukturieren, wer was entscheidet und wo das Ergebnis landet. Ein fünfter Typ (Governance-Entscheidung) ist strukturell angelegt, inhaltlich aber noch nicht ausgefüllt.

Die vier Typen

Typ	Standard-Entscheider	Dokumentationsort
Fachlich	Technical Lead	Konfigurations-Parameter (siehe Teil V)
Kommerziell	BL Customer & Expo Operations	Portfolio-QBR-Protokoll
Sicherheitskritisch	Notfall- und Krisenmanager	Krisenprotokoll – Pre-mortem-Pflicht
Reputations-relevant	Customer Lead	Jour-Fixe mit Unternehmenskommunikation

Sicherheitskritische Entscheidungen erfordern zusätzlich eine Freigabe durch BL SOD und die jeweils relevante fachliche Einheit. Sie sind grundsätzlich nicht reversibel.

Grundsätze

Entscheidung an niedrigster lösungsfähiger Ebene. Wenn der Lead Committee entscheiden kann, entscheidet er. Eskalation ist Ausnahme.

Dokumentation bindet Verantwortung. Eine nicht dokumentierte Entscheidung gilt als nicht getroffen. Wo genau sie dokumentiert wird, bestimmt der Typ (siehe Tabelle).

Direkte Drähte sind Ausnahmen. Entscheidungen, die außerhalb des offiziellen Pfads fallen (etwa ServicePartner-GF an Messe-CEO), werden nachträglich in den Pfad zurückgeführt – als Post-mortem.

Offen

- **[IST-Befund] Entscheidungs-Dokumentation heute uneinheitlich (SR-08).**
Welche Entscheidungen landen in der Konfiguration, welche im Ticket, welche im Jour-Fixe? Regel fehlt.
-

Teil III – Dienstleister

10 Dienstleister-Kategorien und Tiers

Auf einen Blick

Externe Leistungserbringer der Messe werden in drei Stufen gegliedert: **ServicePartner** (Tier 1) mit Rahmenvertrag, **Dienstleister mit Rahmenvertrag** (Tier 2) und **Dienstleister ohne Rahmenvertrag** (Tier 3). Sieben Kategorien decken das operative Spektrum ab.

Tier-Logik

Tier 1 → ServicePartner. Rahmenvertrag vorhanden, regelmäßige Beauftragung, häufig eigene Büros/Lager vor Ort bzw. während der Laufzeit. Etwa 25 bis 26 Partner insgesamt. Nur diese Stufe trägt die Bezeichnung „ServicePartner“.

Tier 2 → Dienstleister mit Rahmenvertrag. Rahmenvertrag vorhanden, aber keine regelmäßige Beauftragung über das ganze Veranstaltungsportfolio. Eingesetzt bei spezifischen Bedarfen.

Tier 3 → Dienstleister ohne Rahmenvertrag. Projektbezogen, einmalig oder selten eingesetzt. Onboarding je Veranstaltung.

Die sieben Kategorien

Die Kategorien beschreiben, welche Leistungsbereiche für eine Veranstaltung typischerweise eingekauft werden. Pro Kategorie ist gekennzeichnet, ob die Leistung verbindlich über die Messe laufen muss, vom Aussteller frei vergeben werden kann oder beides möglich ist.

Kategorie	Beispiele	Pflicht / Wahl- Pflicht / Wahl	Hauptansprechpartner Messe
Standbau	Holtmann/ Wörnlein	Wahl	Technical Lead
Logistik / Messespedition	–	Pflicht (Logistik auf dem Gelände) Wahl (Transport bis zum Gelände)	AL Logistik + Security
Standcatering	–	Wahl	Technical Lead
Technik / ITK (LAN, WLAN)	–	Pflicht (Hoheitsgebiet der Messe)	Technical Lead
AV-Medientechnik	–	Wahl	Technical Lead
Sicherheit	ESS	Pflicht	Technical Lead + AL Logistik +

Kategorie	Beispiele	Pflicht / Wahl- Pflicht / Wahl	Hauptansprechpartner Messe
			Security
Registrierung	–	Pflicht	Technical Lead
Reinigung	–	Pflicht (Allgemeinreinigung) Wahl-Pflicht (Standreinigung)	Technical Lead + Operations Lead

Pflicht: Die Leistung läuft zwingend über die Messe – auch bei Gastveranstaltungen. Typisch bei sicherheitsrelevanten oder infrastrukturell gebundenen Gewerken (Elektro, Wasser, ITK, Sicherheit).

Wahl-Pflicht: Die Leistung muss erbracht werden – der Anbieter ist innerhalb der zugelassenen Optionen wählbar. Beispiel Standreinigung: Regelfall ist der ServicePartner der Messe; fremde Dienstleister (in wenigen Fällen bei Großkunden) reinigen tagsüber und verlassen die Hallen spätestens eine Stunde nach Messeschluss.

Wahl: Völlig freie Entscheidung des Ausstellers – ServicePartner der Messe oder eigener Dienstleister. Ist ein Gewerk teilbar, wird je Teilleistung eingeordnet (z. B. Logistik: auf dem Gelände Pflicht, Transport bis zum Gelände Wahl).

Besonderheiten

- **Risiko-Cluster.** Sicherheit (Reputation), IT/Registrierung (Cyber, Datenschutz), Standbau (Partner-Lieferkette, Kostentreiber).
- **Pflicht-Gewerke auch bei Gast.** Elektro, Wasser, ITK und sicherheitsrelevante Leistungen laufen auch bei Gastveranstaltungen zwingend über die Messe.

Offen

- **[Offen] Partner-Wissenspflege.** Wie halten wir implizites Partner-Wissen (etwa 20+ Jahre Standbau-Lagerware bei Holtmann) dokumentiert und übertragbar?

11 Abrechnungsmodelle

Auf einen Blick

Drei Abrechnungsmodelle – Internalisierung, EK/VK und Provision. Welches greift, bestimmen Leistungsart, Vertragsgrundlage und rechtliche bzw. Haftungslage – nicht der Grad der Individualisierung. Der Bestellweg ist davon getrennt: Alle Ausstellerprodukte laufen über den Messe-Shop.

Bestellweg und die drei Abrechnungsmodelle

Der Bestellweg. Alle Ausstellerprodukte werden über den Messe-Shop bestellt bzw. angefragt – Standardleistungen (Elektro, Mietmöbel, Registrierung, Badge-Produktion) ebenso wie individuelle Leistungen (z. B. Rigging). Der Bestellweg ist einheitlich und kein Abrechnungsmodell: Wie bestellt wird, sagt nichts darüber aus, wie abgerechnet wird.

1. Internalisierung. Aussteller und ServicePartner verhandeln direkt; die Messe erhält einen prozentualen Umsatzanteil auf das direkt verhandelte Volumen. Beispiel: „bei 370.000 € gehören uns 370 €“. Typisch bei Speditionsleistungen/Logistik (vermeidet erhebliche Haftungsthemen), Standcatering und Individualleistungen im Standbau (Lounges, Sonderbauten).

2. EK/VK-Prinzip. Die Messe kauft die Leistung ein und verkauft sie an den Aussteller bzw. Messebauer weiter – mit klarer Marge. Typisch bei Elektro, Rigging, Wasser, Standreinigung und Standbewachung. Auch hochgradig individuelle Leistungen (z. B. Rigging) laufen über EK/VK.

3. Provision. Die Messe erhält eine Vermittlungsprovision auf die Leistung eines Dritten. Typisch bei Personalvermittlung (vermeidet den Dreiecksverleih); vor allem bei Gastveranstaltungen relevant.

Hinweis. Der Grad der Individualisierung ist kein Treiber der Modellwahl – Rigging ist hochgradig individuell und wird dennoch über EK/VK abgerechnet. Maßgeblich sind Leistungsart (Eigen- vs. Kundenbedarf), Vertrag und rechtliche Prämissen. Die Verfeinerung der Zuordnung je Gewerk ist Workshop-Frage.

Entscheidungs-Matrix (Default je Gewerk)

Gewerk	Default-Abrechnungsmodell	Anders bei Gastveranstaltung?
Standbau	Internalisierung (Individuelleleistungen im Standbau)	Shift zu EK/VK bei eigenen Gast- Partnern
Standcatering	Internalisierung	unverändert
Elektro / Wasser	EK/VK	unverändert (Pflicht-Gewerk)
Security	EK/VK	unverändert (Pflicht-Gewerk)
Spezialleistungen	EK/VK (z. B. Rigging) oder Provision (z. B. Personalvermittlung)	häufiger Provision bei Gast

Offen

- **[Offen] Einheitliche Mapping-Matrix (SR-14).** Die obige Tabelle ist Vorschlag. Welches Abrechnungsmodell in welcher Kombination aus Gewerk × Veranstalter × Ausstellertyp verbindlich gilt, ist zu entscheiden.
- **[IST-Befund] Gast-Blindspot.** Bei direkter Abrechnung (z. B. Provision) sieht die Messe das Gesamtvolumen nicht.

12 SLAs

Auf einen Blick

Drei Reifestufen bauen aufeinander auf – bevor SLAs greifen, müssen Messung und interne Vereinbarungen stehen. Heute fehlt Stufe 1 fast vollständig (SR-10); die Stufen 2 (OLAs) und 3 (SLAs) sind Workshop-Setzungen. Sieben SLA-Template-Rümpfe als SOLL; konkrete Zielwerte sind pro Vertragsabschluss festzulegen.

Drei Reifestufen

Service-Level-Vereinbarungen sind kein „Hauruck-Einführungs“-Thema. Sie funktionieren nur, wenn die Voraussetzungen davor stehen.

Stufe 1 – Transparenz und Messung. Bevor irgendetwas vereinbart werden kann, muss sichtbar sein, was operativ passiert: Ticket-Reporting, Reaktionszeit-Logging, Vollständigkeits-Indikatoren, KPI-Erfassung pro Gewerk. **Heute fast vollständig fehlend (SR-10).** Ohne diese Basis sind OLAs und SLAs nicht durchsetzbar.

Stufe 2 – OLAs (Operational Level Agreements). Interne Vereinbarungen zwischen Messe-Teams – wie reagieren Customer Success, Operations Management, Expo Realisation, Logistics & Security aufeinander? Beispiel: „Op Mgmt antwortet auf CS-Tickets innerhalb von 4 Stunden während P3–P5.“ OLAs schaffen die interne Erwartungshaltung, bevor sie nach außen verbindlich wird.

Stufe 3 – SLAs mit ServicePartnern. Externe Vereinbarungen mit ServicePartnern, mit messbaren Zielwerten und Sanktionen. Die untenstehende Template-Struktur und Beispiele gelten für diese Stufe – sie sind das Ziel-Bild, nicht der heutige Status quo.

Logik. Stufe 1 ist Voraussetzung für Stufe 2; Stufe 2 ist Voraussetzung für Stufe 3. Wer auf Stufe 3 startet ohne 1 und 2, bekommt SLAs auf Papier, die niemand erfüllen oder messen kann.

Template-Struktur (Stufe 3 – SLAs)

Jedes SLA enthält: - **Leistungsumfang** (was wird wann erbracht) - **Qualitätsschwellen** (messbar, mit Messmethodik) - **Reaktionszeiten** je Auslöser-Typ - **Meldeweg** (Ticket als Haupt, Telefon als Notfall) - **Eskalationspfad** (verweist auf EP-01, EP-02 oder EP-03) - **Sanktionen** bei Nichterfüllung

Beispiele aus dem Messe-Alltag

Sicherheit (ESS). Postenbesetzungsquote 100 Prozent gemäß Plan, Reaktionszeit auf Alarm unter 2 Minuten, Personalnachforderung unter 4 Stunden. Meldeweg SCU-direkt plus 24/7-Telefon. Eskalationspfad EP-02.

Technik / ITK. Verfügbarkeit WLAN mindestens 99,9 Prozent während Laufzeit, Stromversorgung mindestens 99,9 Prozent, Mean Time to Recovery unter 30 Minuten kritisch, unter 2 Stunden nicht-kritisch. Störung-Entgegnahme binnen 5 Minuten 24/7.

Standbau. Pünktlicher Aufbaubeginn gemäß Slot-Plan (Abweichung maximal 15 Minuten), Standbauabnahme vor Öffnung fehlerfrei, Schadensmeldung beantwortet in 2 Stunden während P4 und P5.

Offen

- **[Offen] Zielwerte je Partner.** Die obigen Werte sind Richtwerte aus Branche und Session. Konkrete Vertrags-SLAs pro Partner auszuarbeiten.
 - **[IST-Befund] Heute keine formalen SLAs im Ticket-System.** Supervising passiert informell durch Operations Management. Ziel: messbare Reaktionszeiten für Tier-1-Kategorien einführen.
-

Teil IV – Risiko und Krise


13 Risikomanagement

Auf einen Blick

Sieben Risikokategorien decken das operative Spektrum ab. Ein Risiko ist steuerbar durch vorgehaltene Maßnahmen. Eine Krise ist ein realisierter Vorfall mit unmittelbarer Handlungs- und Informationspflicht. Der Übergang wird durch den Notfall- und Krisenmanager entschieden.

Die sieben Risikokategorien

Die Kategorien gliedern Risiken nach Art der Auswirkung und sind so geschnitten, dass jede Kategorie unterschiedliche Verantwortungs- und Reaktionslogiken hat. Sie sind nicht hierarchisch – alle sieben können in einer Veranstaltung gleichzeitig relevant sein.

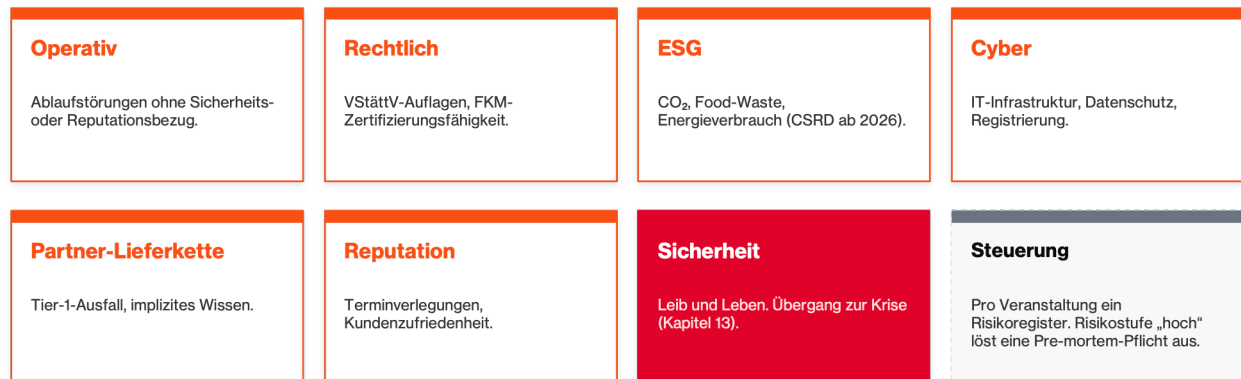

Grafik 9. Risikokategorien und -steuerung.

Risiko-Datensatz

Jedes Risiko wird mit Kategorie, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung, Maßnahmen, Verantwortlichem und Phasenbezug geführt. Bei Risikostufe hoch löst das System eine Pre-mortem-Pflicht aus (siehe Teil V, Kapitel 16).

Risikoregister pro Projekt

Struktur. Pro Veranstaltung ein Risikoregister mit Verweis auf das Projekt, Einträge (Risiko-Referenzen), Review-Rhythmus und Verantwortlichem.

Review-Rhythmus. Im Standardfall an drei Phasenpunkten: Neu-Bewertung in P2, Maßnahmen-Check in P4, Closing in P7.

Beispielrisiken pro Kategorie

Kategorie	Beispiel	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung
operativ	Nichtverfügbarkeit bestellter Leistungen	mittel [Annahme]	niedrig
operativ	Verzug im Order Management (SR-09)	mittel	mittel
rechtlich	VStättV-Auflagen nicht eingehalten	niedrig	hoch
cyber	Ausfall Registrierungssystem während Laufzeit	niedrig	hoch
cyber	Datenschutz-Verletzung	niedrig	kritisch
partner	Tier-1-Partner fällt kurzfristig aus	niedrig	hoch
reputation	Terminverlegung löst Branchenproteste aus	niedrig	kritisch
sicherheit	Müdigkeitsbedingte Fehler Ende Aufbau	mittel	mittel
sicherheit	Neue Bausteine ohne Pre-mortem (SR-06)	mittel	hoch
sicherheit	Diebstahl von Exponaten im Abbau	mittel	mittel

Weitere Beispielrisiken pro Kategorie werden im Anhang gepflegt.

Offen

- **[Offen] Pre-mortem-Auslöser über Risikostufe hinaus.** Welche weiteren Kriterien lösen eine Pre-mortem-Pflicht aus?
- **[Offen] Label-Kontrolle im Abbau.** Entscheidung, ob eine aktive Kontrolle eingeführt wird (Schutz vor Exponat-Diebstahl).

14 Krise und Triage

Auf einen Blick

Eine Krise ist ein eskalierter Vorfall. Sie unterscheidet sich vom Risiko durch unmittelbare Handlungs- und Informationspflicht. Vier Triage-Stufen strukturieren die Kritikalität – ihre konkreten Kriterien und Zeitschwellen sind zentrales Workshop-Thema.

Der Übergang Risiko → Krise

Ein Risiko wird zur Krise, wenn eine Kombination aus Auswirkung und Zeitdruck eintritt. Der Übergang ist Triage-Entscheidung des Notfall- und Krisenmanagers. Grundsatz: **im Zweifel höher einstufen**. Eine Unterschätzung ist das kritischere Fehlverhalten als eine Überschätzung.

Die Infrastruktur

Security Control Unit (SCU). 24/7-Alarmeinheit, extern gestellt. Physisch hinter dem schwarzen Gebäude. Überwacht Kameras. Während der Laufzeit sitzen Polizei und Rotes Kreuz mit im Gebäude.

Notfall- und Krisenmanager. Rolle im Team Logistics & Security. Wird bei jedem Krisenvorfall informiert. Entscheidet, wie weiter kommuniziert wird – direkt an CEO, an BL Service Operations & Data, an fachliche Einheiten (HR, BR, Unternehmenskommunikation, Recht, Facility, Finance, IT, Technical Lead, TFM).

Krisen-Eskalationspfad

Der Krisen-Eskalationspfad ist getrennt vom Standard- und Beschwerdepfad (Kapitel 7). Er greift, sobald ein Vorfall die Schwelle zur Krise überschreitet.

Stufe	Rolle	Reaktionszeit	Weg (Vorschlag)
1	Notfall- und Krisenmanager	sofort	Telefon 24/7
2	BL Service Operations & Data + fachliche Einheiten (HR, BR, Unternehmenskommunikation, Recht, Facility, Finance, IT)	je nach Triage-Stufe	Telefon + E-Mail
3	CEO / Executive Board	je nach Triage-Stufe	über den Notfall- und Krisenmanager

Parallele Information immer an Customer Lead und Technical Lead.

Bekannte Umgehung. Direkter Draht zwischen ServicePartner-Geschäftsführung und Messe-CEO. Rückführungspflicht in den offiziellen Pfad ist Grundsatz, operativ aber noch nicht verankert.

Die vier Triage-Stufen (Platzhalter-Struktur)

Stufe	Name	Zeitfenster	Pflicht-Information
TS-01	Niedrig (lokal lösbar)	im nächsten Sicherheitsmeeting	Notfall- und Krisenmanager (Kenntnis), tägliches Sicherheitsmeeting
TS-02	Mittel (AL-/BL-Info, kein CEO)	BL Service Operations & Data binnen 1 Stunde	Notfall- und Krisenmanager, AL Logistik + Security, BL Service Operations & Data, Customer Lead
TS-03	Hoch (CEO-Info, externe Sichtbarkeit)	CEO binnen 30 Minuten	zusätzlich CEO, Unternehmenskommunikation, ggf. Polizei, BG
TS-04	Kritisch (Großschaden)	parallel an alle unter 5 Minuten	CEO, Executive Board, Krisenstab, Behörden (Polizei, Feuerwehr, BG, ggf. BSI)

Beispiele aus der Session

- **Demonstrationen** vor dem Messegelände (insbesondere bei sicherheitsrelevanten Themenveranstaltungen wie Enforce Tac) → TS-03.
- **Unfälle** in Aufbau- oder Abbauphase, bis zu Todesfällen → TS-03 oder TS-04.
- **Pickpocketing, Diebstähle** → TS-01.
- **Medizinische Notfälle** (Kreislaufzusammenbruch, Herzinfarkt) → TS-01 oder TS-02.
- **Sicherheitskritische Exponate** (Gefahrgut, halbautomatische Gewehre bei Enforce Tac / IWA) → mindestens TS-02, abhängig vom Kontext.

Offen

- **[Offen] Konkrete Kriterien und Zeitschwellen je Stufe (SR-03).** Zentral für die Operationalisierbarkeit. Triage-Konzepte existieren branchenweit als feststehendes Format und sind übertragbar – eingeschätzt als Quick-Win.
- **[Offen] Wer-informiert-wen-Matrix.** Struktur ist angelegt (Stufe × Empfänger × Zeitfenster × Kanal), Inhalte fehlen.
- **[Offen] Pre-mortem-Pflicht bei Bausteinen ohne Sicherheitsbezug.** Soll die Pflicht nur bei Sicherheitskategorien gelten oder auch bei Risikostufe hoch aus anderen Kategorien?

Teil V – Lernen und Verbessern

15 Die Konfiguration einer Veranstaltung

Auf einen Blick

Jede Veranstaltung wird durch eine **Konfiguration** beschrieben: eine strukturierte Liste von etwa 50 Parametern, die festhält, welche Dienstleister, Schlüsselpersonen, Maßnahmen, Konzepte und Infrastruktur-Elemente konkret zum Einsatz kommen. Die Konfiguration ist das gemeinsame Gedächtnis einer Veranstaltung – sie macht sichtbar, was im Vergleich zur Vorveranstaltung gleich bleibt und was sich ändert.

Warum eine Konfiguration

Veranstaltungen wiederholen sich in weiten Teilen: dieselben Service Partner, dieselben Standards, dieselben Schlüsselrollen. Statt für jede Edition neu zu planen, wird die Konfiguration der Vorveranstaltung als Ausgangspunkt genommen und gezielt angepasst. Das hat drei operative Vorteile:

- **Übergaben werden einfacher.** Eine neue Schlüsselperson sieht in der Konfiguration, was bisher galt – und muss nicht alles aus Gesprächen rekonstruieren.
- **Risiken werden sichtbar.** Jede Änderung (Delta) ist dokumentiert. Pre-mortem-Pflichten und Freigaben hängen am Delta.
- **Retrospektiven haben einen Referenzpunkt.** Nach P7 wird die Ist-Konfiguration gegen die freigegebene Soll-Konfiguration gehalten – Lernpunkte werden konkret.

Wie kommt eine Konfiguration zustande?

Jede Phase einer Veranstaltung kann verschiedene Module beinhalten. Bei der Konzeption einer Veranstaltung müssen diese Module eingesetzt werden. Daraus ergibt sich die Komplexität einer Veranstaltung, aber auch die Übersicht aller Dinge, die berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Module je Phase und Kategorie müssen zu einem späteren Zeitpunkt erarbeitet werden.

KONFIGURATIONS-PARAMETER INTERAKTIV

PARAMETER

Security-Check Flughafenmodus ▾

DELTA ZUR VORVERANSTALTUNG

☒ unverändert
☐ angepasst
☐ neu

RISIKOSTUFE

☒ niedrig
☐ mittel
☐ hoch

Parameter	Security-Check Flughafenmodus · Maßnahme
Effektive Risikostufe	niedrig
Pre-mortem-Pflicht	nein
Freigabe	keine zusätzliche Freigabe (Parameter ist Standard)

Grafik 10. Beispiel für einen KI-gestützten Konfigurator, der die Planung, Steuerung und Durchführung entsprechend der ausgewählten Module erleichtert.

Wie die Konfiguration im Alltag wirkt

Für eine operative Kraft bei der Messe heißt das praktisch:

- **Beim Onboarding einer neuen Veranstaltung** ist die Konfiguration der erste Lesestoff – wer sind die ServicePartner, wer trägt die drei Lead Rollen, welche Sicherheits-Maßnahmen sind gesetzt, welche Sonderbauten gibt es.
- **Bei jeder Änderung** (z. B. „der Standbauer wechselt“, „wir führen einen Flughafen-Modus-Check ein“) wird die Konfiguration als Delta dokumentiert. Risikostufe und Pre-mortem-Pflicht ergeben sich aus dem Delta.
- **Vor der Aktivierung** (P0, P3, P7) gibt der Lead Committee die Konfiguration frei. Erst danach gilt sie als verbindliche Arbeitsgrundlage.

Die vier Governance-Schritte

1. Konfiguration erstellen. Basis ist die Konfiguration der Vorveranstaltung. Parameter werden geprüft, übernommen oder angepasst. Jede Änderung wird als Delta markiert.

2. Commitment. Der Lead Committee gibt die Konfiguration frei. Drei Review-Zeitpunkte: vor P0, vor P3, nach P7.

3. Aktivierung. Die freigegebene Konfiguration wird zum verbindlichen Rahmen der Veranstaltung – Abweichungen sind ab jetzt begründungspflichtig.

4. Review. Nach P7 folgt die Retrospektive (Kapitel 15). Erkenntnisse fließen in die Konfiguration der Folgeveranstaltung – der Kreis beginnt von vorne.

Was ein Parameter beschreibt

Ein Parameter ist eine einzelne Entscheidung in der Konfiguration. Er hat:

- **Kategorie** – welche Art von Entscheidung (Technologie, Maßnahme, Konzept, Schlüsselperson, Dienstleister, Infrastruktur, Format).
- **Name und Wert** – was konkret gesetzt ist (z. B. „Security-Service-Partner = ISS“).
- **Risikostufe** – niedrig, mittel oder hoch. Bei hoch ist ein Pre-mortem Pflicht.
- **Delta zur Vorveranstaltung** – unverändert, angepasst, neu, entfernt.
- **Pre-mortem-Pflicht** – automatisch ausgelöst bei Risikostufe hoch.

Beispielparameter

Name	Kategorie	Wert	Risikostufe	Delta
Security-Service-Partner	Dienstleister	ESS	mittel	unverändert
Security-Check im Flughafenmoduls	Maßnahme	aktiviert	hoch	neu
Customer Lead (Schlüsselperson)	Schlüsselperson	Person A (extern)	mittel	unverändert

Der Wechsel einer Schlüsselperson wird automatisch Risikostufe hoch.

Offen

- **[Offen] Default-Parameter-Liste je Veranstaltungs-Archetyp.** Welche 50 Parameter gelten je Kombination aus Art, Veranstalter und Größe als Standard?
- **[Offen] Zusätzliche Pre-mortem-Trigger.** Über „Risikostufe hoch“ hinaus – welche Kategorien lösen zusätzlich aus?

16 Retrospektiven

Auf einen Blick

Fünf Retrospektive-Formate decken die Lernschleifen ab – von der Einzelveranstaltung bis zum Pre-mortem vor neuen Bausteinen. Keines davon wird heute systematisch durchgeführt (SR-08). Die Formate sind verbindlich angelegt, aber in der Praxis noch zu etablieren.

Die fünf Formate



Grafik 11. Übersicht der (möglichen) Lernformate.

Grundsätze

Jede Retrospektive erzeugt Output. Mindestens eines von drei: Parameter-Delta in der Konfiguration, Update einer Standardvorlage oder eine konkrete Maßnahme mit Ownership. „Keine Änderung“ ist zulässig, muss aber explizit dokumentiert werden.

Governance-Schleife. Konfiguration → Commitment → Aktivierung → Review. Die Retrospektive bezieht sich auf die gesetzte Konfiguration, nicht auf einen Dauerzustand.

Offen

- **[IST-Befund] Strukturierte Retrospektiven finden heute nicht systematisch statt (SR-08).**
 - **[Offen] Formate und Moderation.** Konkretes Design der Formate und Festlegung der Moderation; idealerweise extern oder rollenfremd. Konkrete Empfehlung offen.
 - **[Offen] KVP-Verantwortlicher auf Portfolio-Ebene.** Portfolio-QBR existiert, KVP-Verantwortung aber nicht personifiziert.
-

Anhang A – Sammelregister der offenen Punkte

Dieses Register bündelt alle offenen Punkte aus dem Playbook. Die im Validierungs-Workshop (02.07.2026) entschiedenen Punkte – Gates je Phasenübergang, Zusammenlegung der Phasen 2 und 3, Standabnahme vor Eröffnung, Abschlusskriterium der Nachbereitung – sind in den Fließtext übernommen und hier nicht mehr geführt. Wenn Sie den Review-Workshop vorbereiten, ist das die Arbeitsliste.

[Offen – Allgemein] – 13 Punkte

1. Imagine World – Zuordnung in der Typologie (Kapitel 1).
2. Messe B2C x Eigen / Partner – strategische Relevanz (Kapitel 1).
3. Hallen-Clean-Cut-Kriterium in P6.
4. Dokumentationsort je Check-Point.
5. RACI-Delta bei Gast- und Partnerveranstaltungen.
6. Claim-Komplexität bei Gastveranstaltungen.
7. Lead Committee Protokoll-Template.
8. Stufe 3 des Beschwerdepfads EP-02, inkl. definierter Meldeweg (Lösungskandidat: QR-Code am Stand).
9. Triage-Kriterien und Zeitschwellen (TS-01 bis TS-04).
10. Wer-informiert-wen-Matrix je Triage-Stufe.
11. [Annahme] Größenklassen: Hallenfläche als Brutto-Quadratmeter – mit Messe zu bestätigen (Kapitel 1).
12. Begriffliche Abgrenzung Ticket-System vs. Gast-Shop (Gast-OSC) bei Gastveranstaltungen (Kapitel 4).
13. [Annahme] Risiko-Einstufung „Nichtverfügbarkeit bestellter Leistungen“: Auswirkung mittel (Kapitel 13).

[Offen – Dienstleister-Bezug] – 4 Punkte

18. Tier-Auf- und -Abstiegs-Kriterien.
19. Partner-Wissenspflege (implizites Wissen dokumentieren und übertragen).
20. Einheitliche Mapping-Matrix der Abrechnungsmodelle (SR-14).
21. SLA-Zielwerte je Partner.

[Offen – Governance-Bezug] – 5 Punkte

22. Rolle und Umfang des dritten der Lead Rolle (SR-04).
23. Projekt-Rollen-Template (welche Rollen je Veranstaltung, welche Besetzung).
24. Weitere Gremien (Kick-off-Formate, Portfolio-Sprechstunden).
25. Governance-Entscheidungstyp – inhaltlich ausfüllen.
26. Default-Parameter-Liste je Veranstaltungs-Archetyp.

[Offen – KVP-Bezug] – 3 Punkte

- 27. Moderation der Retrospektiven (extern / rollenfremd).
- 28. KVP-Verantwortlicher auf Portfolio-Ebene.
- 29. Label-Kontrolle im Abbau (P6).

[Offen – Entscheidung] – 2 Punkte

Business / Führung.

- 30. Pre-mortem-Pflicht bei Bausteinen ohne Sicherheitsbezug.
- 31. Pre-mortem-Trigger über Risikostufe hoch hinaus.

[Welle 2] – 3 Module (separates Dokument)

- 33. Kommunikation und Kollaboration.
- 34. KPI.
- 35. Tailoring und Skalierung.

Ende.
